

PNRR M6 – Missione Salute

Lo stato di attuazione

Basilicata

A cura dell'Area Stato Sociale e Diritti



Marzo 2025



PNRR M6 - Missione Salute

Lo stato di attuazione

Basilicata

PNRR Missione Salute (M6). A tre anni dall'avvio del PNRR e a 15 mesi dalla scadenza, **lo scenario dello stato di attuazione della Missione Salute (M6) è allarmante con troppi progetti che procedono a rilento, con ritardi nell'esecuzione dei lavori o ancora fermi alla fase di progettazione**, come già segnalato dalla CGIL nazionale ([“PNRR M6 Missione Salute. Lo stato di attuazione”](#)).

Le poche opere completate e collaudate rendono concreto il rischio di non conseguire gli obiettivi strategici entro le scadenze previste.

Dalla piattaforma di monitoraggio ReGiS predisposta dal MEF, a dicembre 2024 in Basilicata risultano finanziati **130 progetti** per **166,4 milioni di euro** di finanziamenti complessivi. Al netto dei progetti per il rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica SSN (v. nota a pag. 9), sono stati spesi finora **24,8 milioni di euro**, pari al **14,9%** dei fondi disponibili.

Dei progetti di cui è possibile monitorare l'iter di attuazione, solo il 31,5% risulta concluso mentre il 53,2% presenta ritardi in almeno una delle fasi di attuazione.

Particolarmente preoccupante e incerta risulta essere la situazione per la realizzazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità: strutture strategiche per l'attuazione della riforma dell'assistenza territoriale.

Case della Comunità. Per quanto riguarda le **Case della Comunità**, da ReGIS risultano finanziati progetti per **19 strutture**, per un valore complessivo di **38,4 milioni** di euro. A dicembre 2024 risultano effettuati **pagamenti per soli 2,1 milioni**: dopo tre anni dall'avvio del PNRR, è stato **speso il 5,6% dei fondi disponibili**.

Dei progetti monitorati, nessuno risulta **completato e collaudato**, mentre ben 17 progetti presentano almeno uno step in ritardo (89,5% dei progetti totali a fronte di una media nazionale del 62,6%).

Lo stato di avanzamento può essere analizzato osservando le diverse fasi di realizzazione: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e conclusione.

Per quanto riguarda la **fase esecutiva delle opere**, risultano in corso i lavori per la realizzazione di 2 strutture (10,5% del totale delle opere previste) ma ci sono **ritardi evidenti e diffusi nell'esecuzione dei lavori che riguardano la maggior parte dei progetti**. In particolare, ci sono ritardi nell'avvio dei lavori di esecuzione di 10 strutture (52,6%), a cui si aggiungono altre 7 opere con ritardi nella fine dei lavori (36,8%).

Allarmante la distanza proibitiva dal traguardo del collaudo per 8 progetti, ancora fermi alla fase della **progettazione esecutiva**, step che di fatto impedisce l'avvio dei cantieri.

Ospedali di Comunità. Non meno critica risulta la situazione degli **Ospedali di Comunità**, le strutture sanitarie a prevalente gestione infermieristica, fondamentali per garantire le cure intermedie e la continuità assistenziale nel passaggio dall'ospedale al ritorno a casa dei pazienti.

Sono stati finanziati progetti per **5 strutture**, per un valore complessivo di **14,3 milioni** di euro, dei quali **nessuno risulta completato e collaudato**, mentre 4 progetti presentano almeno una fase in ritardo (80,0% del totale a fronte di una media nazionale del 61,8%).

La fase dell'**esecuzione dei lavori non risulta completata per nessuno dei 5 Ospedali di Comunità**; sono in **corso i lavori per la realizzazione** di una struttura (20,0%), ma ci sono ritardi nei lavori in **tutte le altre opere da realizzare**: in ritardo l'avvio dei lavori di esecuzione di 2 strutture (40,0%) a cui si aggiungono i ritardi nella fine dei lavori di altri 2 Ospedali di Comunità (40,0%).

Così come per le Case della Comunità preoccupano i ritardi nella fase della **progettazione esecutiva** in cui è ferma una struttura da realizzare. Inoltre, a fronte di un finanziamento complessivo di **14,3 milioni** di euro, a dicembre 2024 risultavano essere stati effettuati **pagamenti per 406 mila euro** (pari al 2,8% dei fondi).

In questo scenario di ritardi nella realizzazione delle opere previste dalla Missione 6 del PNRR e in particolare per Case e Ospedali di Comunità, risulta **davvero difficile credere che il Governo possa immaginare seriamente di riuscire a terminare tutti i lavori per collaudare le strutture entro giugno 2026**, data prevista per la scadenza definitiva.

Personale. Resta poi il nodo del **personale**. Per migliorare la qualità della vita delle persone e garantire il corretto funzionamento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità **non è sufficiente costruire le strutture, ma è fondamentale dotarle del personale necessario per assicurare servizi efficienti e un'adeguata assistenza sanitaria ai cittadini**.

Secondo il DM 77/2022, sono stati stabiliti specifici standard di personale per queste strutture, prevedendo la presenza di infermieri, operatori sociosanitari, assistenti sociali e altre figure professionali indispensabili. Secondo le stime nazionali, per rendere operative tutte le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità sarebbe necessario assumere almeno 33.000 unità di personale. In particolare, il fabbisogno per ogni Casa della Comunità varia da 7 a 11 infermieri, 1 assistente sociale e da 5 a 8 unità di personale di supporto, mentre per gli Ospedali di Comunità si prevede la presenza di un minimo di 2.800 fino a 3.600 infermieri, oltre a operatori sociosanitari e personale riabilitativo.

In Basilicata, con 19 Case della Comunità e 5 Ospedali di Comunità finanziati, si stima la necessità di un numero compreso tra 133 e 209 infermieri, oltre a 19 assistenti sociali e un numero di operatori sociosanitari variabile tra 95 e 152

Attualmente, non sono stati attuati piani concreti per l'assunzione di queste figure professionali, nonostante la necessità di garantire il funzionamento delle strutture già in costruzione.

La mancanza di personale rischia di rendere vani gli investimenti del PNRR nelle strutture sanitarie territoriali. Senza il giusto numero di operatori, Case e Ospedali di Comunità non potranno garantire i servizi previsti, compromettendo l'obiettivo di rafforzare l'assistenza sanitaria di prossimità. Inoltre, la scarsità di personale potrebbe portare a un aumento della pressione sugli ospedali, con un numero crescente di accessi impropri al pronto soccorso.

Quanti ricoveri impropri si potrebbero evitare garantendo la presa in carico da parte di un'adeguata rete di assistenza territoriale? Quanta pressione negli ospedali, a partire dagli accessi impropri al pronto soccorso, si potrebbe evitare?

Per rendere effettivo il diritto alla tutela della salute, occorre adeguare l'offerta di assistenza ai bisogni della popolazione con un **forte investimento nel territorio, superando divari e disegualianze** tra le diverse aree del Paese e soprattutto occorre recuperare i preoccupanti ritardi nell'attuazione della Missione 6 del PNRR che rappresenta un'occasione che il nostro Paese non può disperdere.

Su questi obiettivi **proseguirà la mobilitazione** con ogni iniziativa utile a raggiungere l'obiettivo di rafforzare e rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale e garantire il diritto alla salute.



Le Case della Comunità

Case della Comunità - BASILICATA

	Popolazione (31.12.2023)	Case Comunità (progetti finanziati)	Popolazione / Case Comunità	Finanziament o totale (€)	Progetti monitorati			
					Progetti	Progetti completati	Tutti gli step nei tempi	Almeno uno step in ritardo
Matera	189.981	6	31.664	10.888.719	6	0	2	4
Potenza	343.252	13	26.404	27.475.634	13	0	0	13
BASILICATA	533.233	19	28.065	38.364.353	19	0	2	17
In %					100,0%	0,0%	10,5%	89,5%
ITALIA in %					100,0%	1,8%	37,4%	62,6%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024


Case della Comunità - Esecuzione lavori - BASILICATA


	Progetti aggiudicati	Esecuzione lavori				
		Conclusi	In corso	Ritardo inizio	Ritardo fine	Pianificati
Matera	6	0	2	4	0	0
Potenza	13	0	0	6	7	0
BASILICATA	19	0	2	10	7	0
In %	100,0%	0,0%	10,5%	52,6%	36,8%	0,0%
ITALIA in %	100,0%	3,8%	42,4%	44,8%	7,3%	1,8%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024

Esecuzione lavori:

- Conclusi - Conclusi alla data di elaborazione dei dati
- In Corso - Avviati con una data prevista di fine successiva alla data di elaborazione dei dati
- In Ritardo Inizio - Che non risultano avviati entro la data prevista (trascorsa)
- In Ritardo Fine - Avviati ma non conclusi entro la data prevista (trascorsa)
- Pianificati - Da avviare in una data successiva alla data di elaborazione dei dati

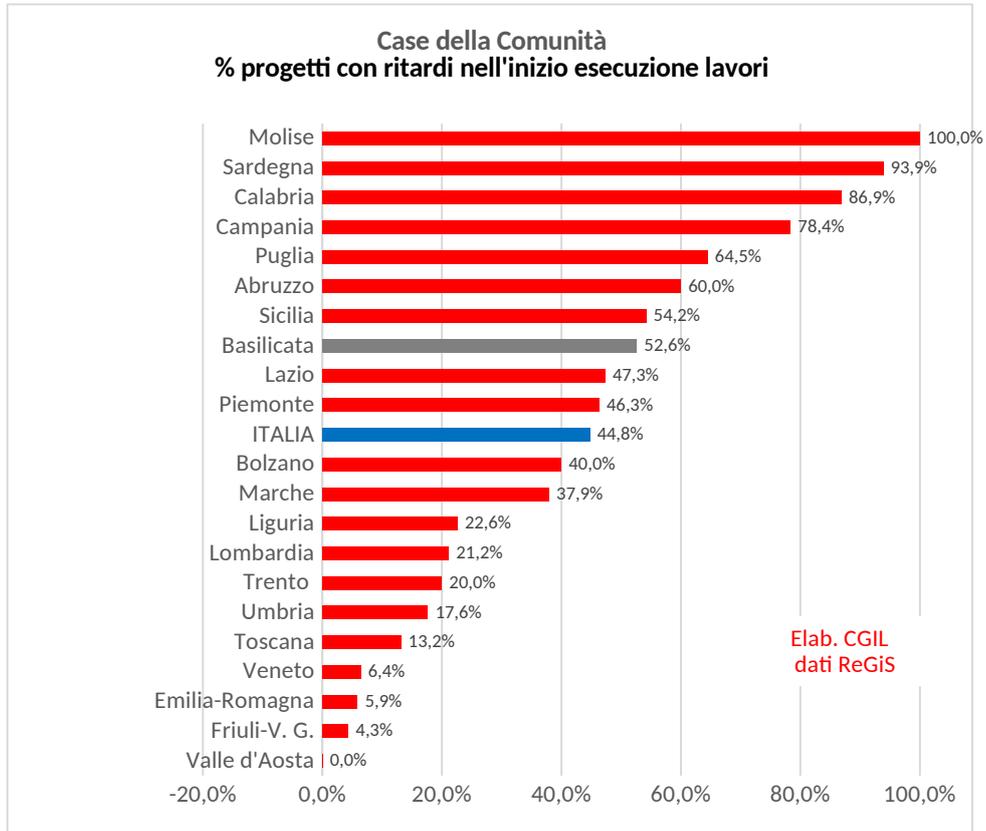

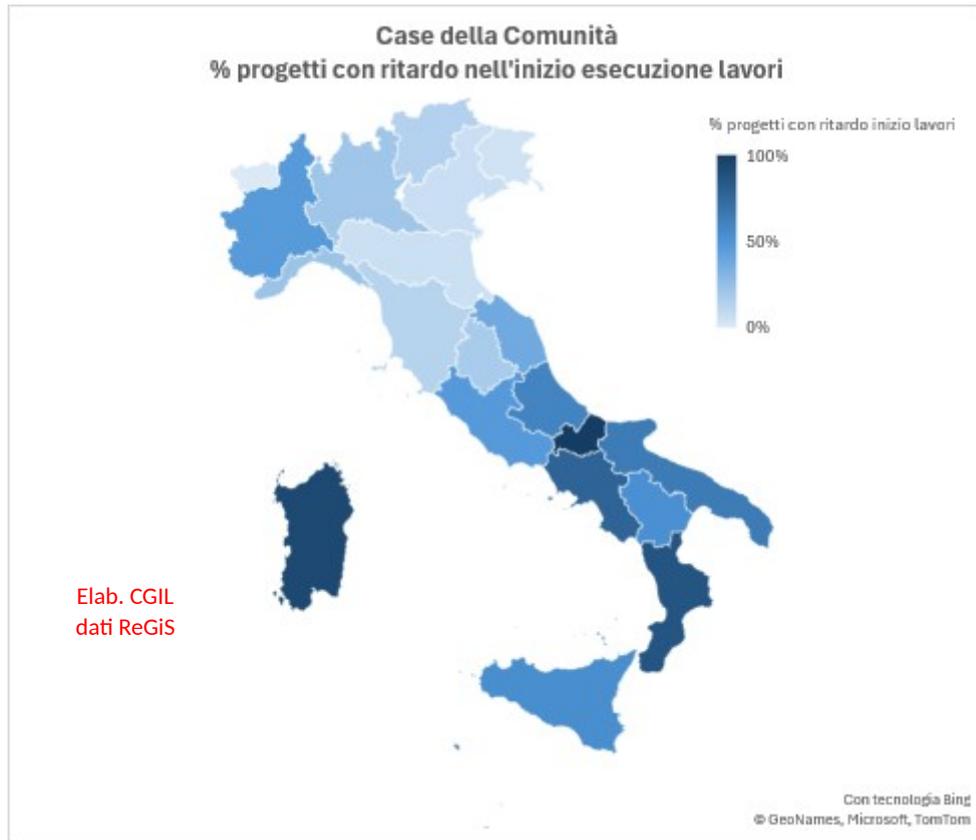

PNRR M6 - Missione Salute

Ospedali di Comunità - BASILICATA

	Popolazione e (31.12.2023)	Ospedali di comunità (progetti finanziati)	Popolazione / Ospedali di comunità	Finanziament o totale (€)	Progetti monitorati			
					Progetti	Progetti completati	Tutti gli step nei tempi	Almeno uno step in ritardo
Matera	189.981	2	94.991	4.795.413	2	0	1	1
Potenza	343.252	3	114.417	9.477.834	3	0	0	3
BASILICATA	1.269.571	5	253.914	14.273.247	5	0	1	4
In %					100,0%	0,0%	20,0%	80,0%
ITALIA in %					100,0%	2,3%	38,2%	61,8%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024


Ospedali di Comunità - Esecuzione lavori - BASILICATA


	Progetti aggiudicati	Esecuzione lavori				
		Conclusi	In corso	Ritardo inizio	Ritardo fine	Pianificati
Matera	2	0	1	1	0	0
Potenza	3	0	0	1	2	0
Totale	5	0	1	2	2	0
In %	100,0%	0,0%	20,0%	40,0%	40,0%	0,0%
ITALIA in %	100,0%	4,7%	43,3%	45,4%	5,4%	1,2%

Elab. CGIL - Dati ReGiS 13.12.2024

Esecuzione lavori:

- Conclusi - Conclusi alla data di elaborazione dei dati
- In Corso - Avviati con una data prevista di fine successiva alla data di elaborazione dei dati
- In Ritardo Inizio - Che non risultano avviati entro la data prevista (trascorsa)
- In Ritardo Fine - Avviati ma non conclusi entro la data prevista (trascorsa)
- Pianificati - Da avviare in una data successiva alla data di elaborazione dei dati

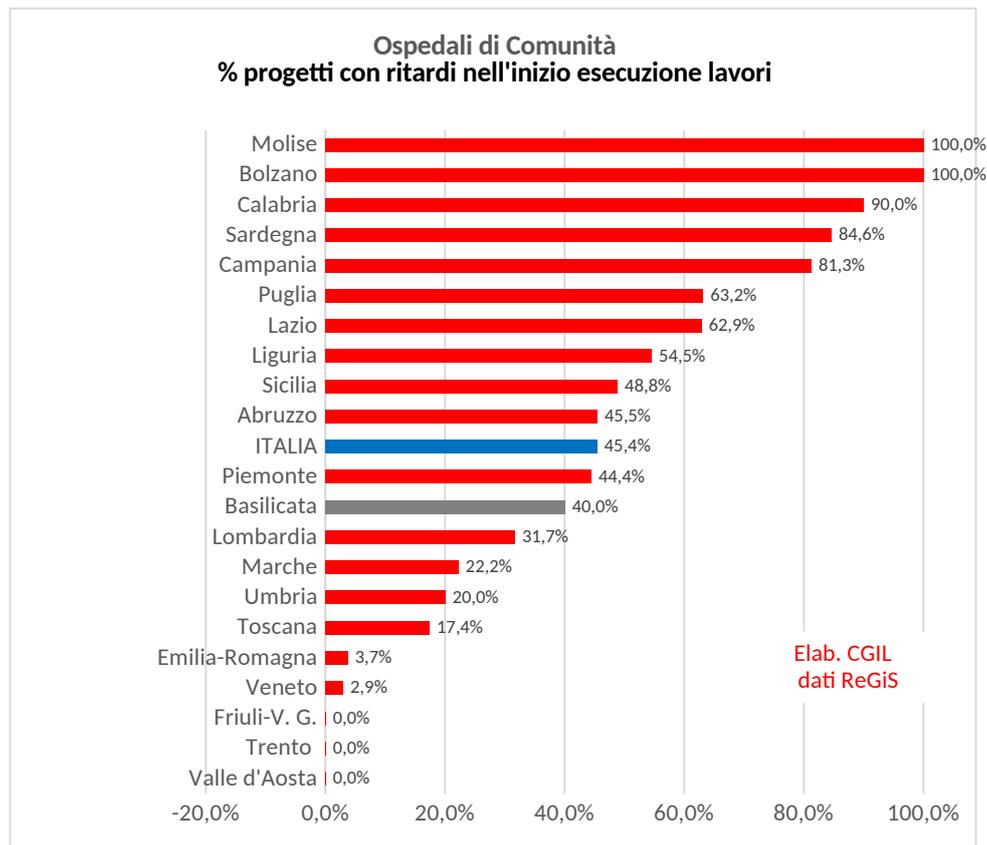

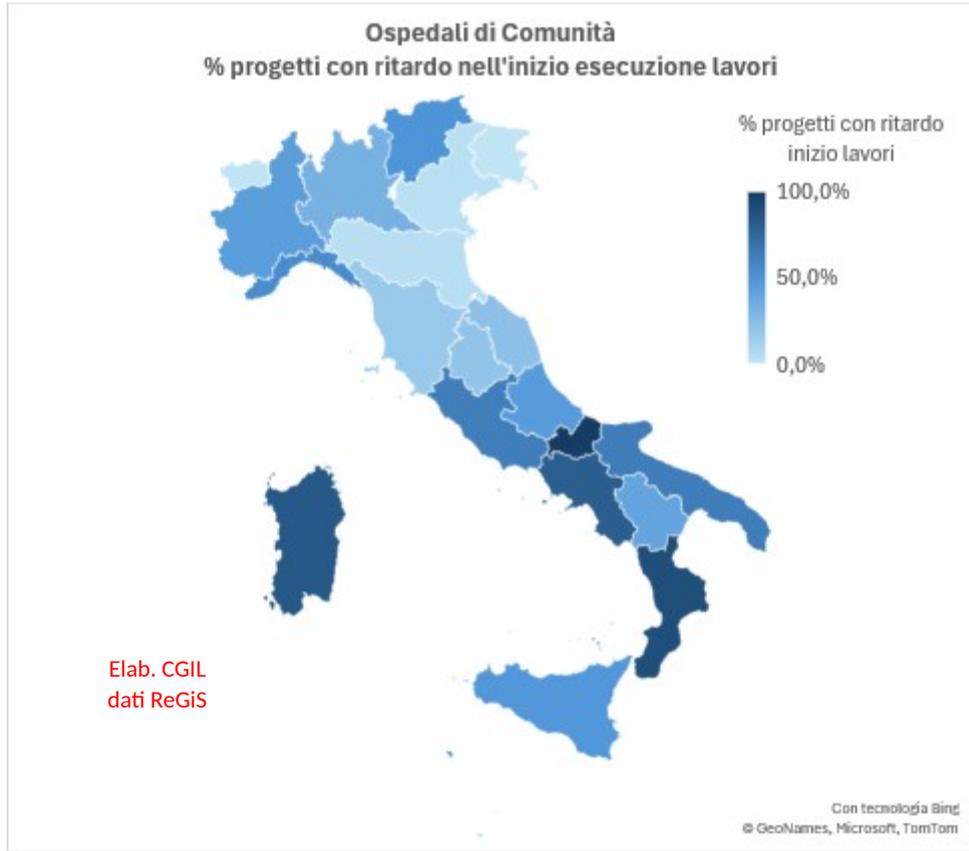

Fondi e spese effettuate

Case della Comunità

	Finanziamento totali (€)	Pagamenti effettuati (€)	% pagamenti/ finanziam. totale
Matera	10.888.719	237.065	2,2%
Potenza	27.475.634	1.912.091	7,0%
BASILICATA	38.364.353	2.149.156	5,6%

Ospedali di Comunità

	Finanziamento totali (€)	Pagamenti effettuati (€)	% pagamenti/ finanziam. totale
Matera	4.795.413	45.513	0,9%
Potenza	9.477.834	360.903	3,8%
BASILICATA	14.273.247	406.415	2,8%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024

		finanziati	o totale (€)	effettuati (€)			completati	step nei tempi	uno step in ritardo
M6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per assistenza territoriale	Case Comunità	19	38.364.353	2.149.156	5,6%	19	0	2	17
						100,0%	0,0%	10,5%	89,5%
	Ospedali Comunità	5	14.273.247	406.415	2,8%	5	0	1	4
						100,0%	0,0%	20,0%	80,0%
	Casa primo luogo di cura e telemedicina	11	47.908.782	12.998.398	27,1%	10	7	7	3
						100,0%	70,0%	70,0%	30,0%
M6C2 Innovazione, ricerca e digitalizzaz. del SSN	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	2	8.120.140	160.448	2,0%	2	0		2
						100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero	75	43.655.775	5.349.712	12,3%	73	32	41	32
						100,0%	43,8%	56,2%	43,8%
	Rafforzamento infrastruttura tecnologica e strumenti raccolta dati	6	7.527.750	0	0,0%	6	0		6
						100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Rafforzamento e potenziamento ricerca biomedica SSN (*)	7	1.644.945	182.601	11,1%	4	0	4		
					100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	
Sviluppo competenze tecniche e professionali personale SSN	5	4.875.842	0	0,0%	5	0	3	2	
					100,0%	0,0%	60,0%	40,0%	
Totale		130	166.370.834	24.778.316	14,9%	124	39	58	66
%						100,0%	31,5%	46,8%	53,2%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024

(*) Si considerano solo i pagamenti effettuati con risorse PNRR

PNRR M6 - Missione Salute

Matera

PNRR Missione 6 Salute - Case e Ospedali di comunità

	Progetti finanziati	Abitanti/ struttura	Finanziamento totale (€)	Pagamenti effettuati (€)	% pagamenti/ finanziam. totale
Case della Comunità	6	31.664	10.888.719	237.065	2,2%
Ospedali di Comunità	2	94.991	4.795.413	45.513	0,9%
MATERA	8	-	15.684.132	282.578	1,8%
BASILICATA	24	-	52.637.600	2.555.571	4,9%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024

PNRR Missione 6 Salute - Case e Ospedali di comunità - Progetti monitorati

	Progetti monitorati	Progetti completati	in %	Tutti gli step nei tempi	in %	Almeno uno step in ritardo	in %
Case della Comunità	6	0	0,0%	2	33,3%	4	66,7%
Ospedali di Comunità	2	0	0,0%	1	50,0%	1	50,0%
MATERA	8	0	0,0%	3	37,5%	5	62,5%
BASILICATA	24	0	0,0%	3	12,5%	21	87,5%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024. % calcolata sul totale progetti monitorati

PNRR Missione 6 Salute - Case e Ospedali di comunità - Esecuzione lavori

	Progetti aggiudicati	Esecuzione lavori				
		Conclusi	In corso	Ritardo inizio	Ritardo fine	Pianificati
Case della Comunità	6	0	2	4	0	0
Ospedali di Comunità	2	0	1	1	0	0
MATERA	8	0	3	5	0	0
in %	100,0%	0,0%	37,5%	62,5%	0,0%	0,0%
BASILICATA	24	0	3	12	9	0
in %	100,0%	0,0%	12,5%	50,0%	37,5%	0,0%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024

Esecuzione lavori:

- Conclusi - Conclusi alla data di elaborazione dei dati
- In Corso - Avviati con una data prevista di fine successiva alla data di elaborazione dei dati
- In Ritardo Inizio - Che non risultano avviati entro la data prevista (trascorsa)
- In Ritardo Fine - Avviati ma non conclusi entro la data prevista (trascorsa)
- Pianificati - Da avviare in una data successiva alla data di elaborazione dei dati

Case della Comunità

CUP	Titolo	Importo (€)
D41B2200154000 6	COMUNE DI MONTESCAGLIOSO*VIA ARIOSTO SNC*CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA SEDE HUB DI MONTESCAGLIOSO - FONDI PNRR INVESTIMENTO 1	2.525.715
D38I22000110006 6	DISTRETTO SANITARIO DI MONTALBANO JONICO*VIALE DEI CADUTI SNC*CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA SEDE HUB DI MONTALBANO JONICO - FONDI PNRR INVESTIMENTO 1	2.416.240
D91B2200114000 6	DISTRETTO SANITARIO DI IRSINA*VIA AGNESOD SNC*CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA SEDE HUB DI IRSINA - FONDI PNRR INVESTIMENTO 1	1.963.205
D51B2200170000 6	DISTRETTO SANITARIO DI GARAGUSO*VIA EXTRAMURALE SNC*CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA SEDE SPOKE DI GARAGUSO - FONDI PNRR INVESTIMENTO 1	1.420.984
D41B2200155000 6	DISTRETTO SANITARIO DI FERRANDINA*VIA DI CIO SNC*CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA SEDE SPOKE DI FERRANDINA - FONDI PNRR INVESTIMENTO 1	1.288.302
D71B2200141000 6	DISTRETTO SANITARIO DI TURSI*VIA CATTEDRALE SNC*CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA SEDE SPOKE DI TURSI - FONDI PNRR INVESTIMENTO 1	1.274.274

Elab. CGIL - Dati ReGIS

Ospedali di Comunità

CUP	Titolo	Importo (€)
D51B2200159000 6	OSPEDALE DISTRETTUALE DI STIGLIANO*VIA PRINCIPE DI NAPOLI SNC*RAFFORZAMENTO DELL'ESISTENZA SANITARIA INTERMEDIARIA E DELLA SUA STRUTTURA:OSPEDALE DI COMUNITA' C/O OSPEDALE DISTRETTUALE S. PERAGINE DI STIGLIANO	2.425.736
D71B2200123000 6	PRESIDIO OSPEDALIERO DISTRETTUALE DI TINCHI DI PISTICCI*CONTRADA TINCHI DI PISTICCI-VIALE IONIO*RAFFORZAMENTO DELL'ESISTENZA SANITARIA INTERMEDIARIA E DELLA SUA STRUTTURA:OSPEDALE DI COMUNITA' C/O OSPEDALE DISTRETTUALE A. LODICO DI TINCHI	2.369.677

Elab. CGIL - Dati ReGIS

Se si è in possesso delle credenziali di accesso al programma SIRIO-PNRR, cliccando nel numero del CUP, è possibile visionare i dati di dettaglio di ogni progetto e osservare lo stato di avanzamento di ogni attività.



PNRR M6 - Missione Salute

Potenza

PNRR Missione 6 Salute - Case e Ospedali di comunità

	Progetti finanziati	Abitanti/ struttura	Finanziamento totale (€)	Pagamenti effettuati (€)	% pagamenti/ finanziam. totale
Case della Comunità	13	26.404	27.475.634	1.912.091	7,0%
Ospedali di Comunità	3	114.417	9.477.834	360.903	3,8%
POTENZA	16	-	36.953.468	2.272.994	6,2%
BASILICATA	24	-	52.637.600	2.555.571	4,9%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024

PNRR Missione 6 Salute - Case e Ospedali di comunità - Progetti monitorati

	Progetti monitorati	Progetti completati	in %	Tutti gli step nei tempi	in %	Almeno uno step in ritardo	in %
Case della Comunità	13	0	0,0%	0	0,0%	13	100,0%
Ospedali di Comunità	3	0	0,0%	0	0,0%	3	100,0%
POTENZA	16	0	0,0%	0	0,0%	16	100,0%
BASILICATA	24	0	0,0%	3	12,5%	21	87,5%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024. % calcolata sul totale progetti monitorati

PNRR Missione 6 Salute - Case e Ospedali di comunità - Esecuzione lavori

	Progetti aggiudicati	Esecuzione lavori				
		Conclusi	In corso	Ritardo inizio	Ritardo fine	Pianificati
Case della Comunità	13	0	0	6	7	0
Ospedali di Comunità	3	0	0	1	2	0
POTENZA	16	0	0	7	9	0
in %	100,0%	0,0%	0,0%	43,8%	56,3%	0,0%
BASILICATA	24	0	3	12	9	0
in %	100,0%	0,0%	12,5%	50,0%	37,5%	0,0%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024

Esecuzione lavori:

- Conclusi - Conclusi alla data di elaborazione dei dati
- In Corso - Avviati con una data prevista di fine successiva alla data di elaborazione dei dati
- In Ritardo Inizio - Che non risultano avviati entro la data prevista (trascorsa)
- In Ritardo Fine - Avviati ma non conclusi entro la data prevista (trascorsa)
- Pianificati - Da avviare in una data successiva alla data di elaborazione dei dati

Case della Comunità

CUP	Titolo	Importo (€)
H78I22000310002	CASA DI COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI SENISE*VIA ALDO MORO C.DA AIA MARINA*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO	5.007.456
H62C22000080006	CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI LAGONEGRO*VIA PIANO DEI LIPPI*RISTRUTTURAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEGLI AMBIENTI ESISTENTI	4.166.173
H32C22000100006	CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI POTENZA*VIA DELLA FISICA 18/A*ADEGUAMENTO MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE PESANTE DI IMMOBILE ESISTENTE.	3.983.200
H22C22000170006	CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI MARATEA*VIA SAN NICOLA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA	2.112.740
H22C22000180006	CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI SANT'ARCAANGELO*VIA EUROPA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA	2.109.724
H35F22000480006	CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI GENZANO DI LUCANIA*VIA G. FORTUNATO 85013 GENZANO DI LUCANIA*REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO PER ATTIVITA' SANITARIE DELLA CASA DI COMUNITA' DI GENZANO DI LUCANIA	1.768.368
H18I22000560006	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA DESTINARE A CASA DELLA COMUNITA' DI LAVELLO.*VIA SS. 93 - LAVELLO*REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA DESTINARE A CASA DELLA COMUNITA' DI LAVELLO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ESISTENTE.	1.694.027
H78I22000360006	CASA DI COMUNITA' DI SAN FELE*VIA D'ADDEZIO - SAN FELE (PZ)*REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI SAN FELE - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ESISTENTE.	1.544.491
H12C22000170006	CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI VIGGIANELLO*VIA ANZOLOCONTE*RISTRUTTURAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEGLI AMBIENTI ESISTENTI	1.306.699
H52C22000240005	CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI CORLETO PERTICARA*VIA RIONE ALCIDE DE GASPERI*RISTRUTTURAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEGLI AMBIENTI ESISTENTI	1.300.000
H92C22000250005	CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI VIETRI DI POTENZA*VIA GIOVANNI FALCONE*RISTRUTTURAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEGLI AMBIENTI ESISTENTI	1.240.508
H72C22000330005	CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI ANZI CAMASTRA*LOCALITA' CAMASTRA*RISTRUTTURAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEGLI AMBIENTI ESISTENTI	791.596
H12C22000420005	CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI LAGOPESOLE AVIGLIANO*VIA GIACOMO LEOPARDI*RISTRUTTURAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEGLI AMBIENTI ESISTENTI	450.649

Elab. CGIL - Dati ReGIS

Ospedali di Comunità

CUP	Titolo	Importo (€)
H85F22000370006	OSPEDALE DI COMUNIT DI VENOSA - VIA APPIA N. 70 - REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNIT NEL COMUNE DI VENOSA.*VIA APPIA N. 70*OSPEDALE DI COMUNIT DI VENOSA	3.389.235
H22C22000200006	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE OSPEDALE DI COMUNIT DI MARATEA*VIA SAN NICOLA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA	3.183.097
H22C22000160006	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE OSPEDALE DI COMUNIT DI MURO LUCANO*VIA SAN BIAGIO SNC*RISTRUTTURAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEGLI AMBIENTI ESISTENTI	2.905.502

Elab. CGIL - Dati ReGIS

Se si è in possesso delle credenziali di accesso al programma SIRIO-PNRR, cliccando nel numero del CUP, è possibile visionare i dati di dettaglio di ogni progetto e osservare lo stato di avanzamento di ogni attività.



SIRiO Monitoraggio Investimenti PNRR								pnrr.nazionale Logou
DETTAGLIO PROGETTO Home PROGETTI ITER INDICATORI SOGGETTI PAGAMENTI GARE IMPRESE LOCALIZZAZIONI TAGS Manuale								
CASA DI COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELL CASA DI COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI SENISE*VIA ALDO MORO C.DA AIA MARINA*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO								
CUP	CLP	Stato	Procedura attuazione	Soggetto attuatore	Validato	Data Val.	In essere	
H78I22000310002	H78I22000310002	Attivo	Procedura negoziale	REGIONE BASILICATA	Ok	20/11/2024	No	
MISURA								
Codice	Componente	Misura	SubMisura					
M6C111.01.00	Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	Casa della Comunità e presa in carico della persona	Casa della Comunità e presa in carico della persona					
CLASSIFICAZIONE								
Codice	Natura	Tipologia	Settore	SottoSettore	Categoria			
03040530150	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)	INFRASTRUTTURE SOCIALI	SANITARIE	ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI			

FINANZIAMENTO

Totale	PNRR	UE	PNC	FOI	FPOP	Stato	Regione	Provincia	Comune	Altro	Privato	Da reperire	Altri Fondi
5.007.456	1.400.000	1.067.456		140.000			2.400.000						

PAGAMENTI

Finanziamento Totale	Finanziamento PNRR	Totale Pagamenti	Totale Pagamenti PNRR
5.007.456	1.400.000	236.039	236.039

LOCALIZZAZIONE

Regione	Provincia	Comune	CAP	Indirizzo	Territorio	% Localiz	Importo
BASILICATA	POTENZA (PZ)	SENISE	85038	Via Aldo Moro	POTENZA	1	5.007.456

ITER

Stato	Cod.Fase	Fase	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Prevista	Fine Effettiva
★ Concluso	00303	PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	01/07/2022	12/08/2022	31/12/2022	31/07/2023
★ Concluso	00305	PROGETTO DEFINITIVO	01/01/2023	03/03/2023	01/03/2023	27/12/2023
★ Concluso	00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	06/02/2023	20/07/2022	28/04/2023	09/11/2022
★ Concluso	00306	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	03/04/2023	04/10/2023	30/04/2023	08/11/2023
⚠ Ritardo Fine	00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15/07/2023	20/01/2024	01/09/2023	
★ Concluso	00311	AGGIUDICAZIONE	01/09/2023	10/11/2022	19/09/2023	17/05/2023
★ Concluso	00312	STIPULA CONTRATTO	20/09/2023	29/12/2023	30/09/2023	12/01/2024
★ Ritardo Inizio	00313	ESECUZIONE LAVORI	01/10/2023		02/10/2024	
📅 Pianificato	00314	COLLAUDO	31/10/2025		02/02/2026	

INDICATORI TARGET

Stato	Codice	Indicatore	Val. Programmato	Val. Realizzato	Anno-Mese
★	T0105	NR. DI CASE DELLA COMUNITÀ OPERATIVE	1		
★	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	1	1	2024-01
★	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	1	1	2023-05
★	T0277	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA COMUNITÀ	1	1	2024-01

TAGS CLIMA/DIGITALE

Codice Tag	Tipo Tag	Campo Intervento	Coefficiente	Importo Tag
CLS_TAG_CLIMA_025TER	Clima TAG	025TER - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico	40	2.002.982
CLS_TAG_CLIMA_092	Clima TAG	092 - Infrastrutture per la sanità	0	

SOGGETTI

Codice Fiscale	Denominazione	Ruolo	Forma Giur.	Ateco
00949000764	REGIONE BASILICATA	Attuatore	Regione	84.11.10 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA Attività generali di amministrazione pubblica Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
01722360763	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA A.S.P.	Destinatario	Azienda o ente del Serv.San.Naz.(SSN)	84.12.10 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA Regolamentazione delle attività relative alla fornitura di servizi di assistenza sanitaria, dell'istruzione, di servizi culturali e ad altri servizi sociali (esclusa l'assicurazione sociale obbligatoria) Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità
01722360763	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA A.S.P.	Intermediario	Azienda o ente del Serv.San.Naz.(SSN)	84.12.10 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA Regolamentazione delle attività relative alla fornitura di servizi di assistenza sanitaria, dell'istruzione, di

GARE

N	Totale €	Aggiudicati €	Data Ultima Aggiudicazione	Aggiudicatari	SubAppalti	Lavori	Servizi	Forniture	Altro
4	4.103.237	65.912	05/06/2023	4	2	3.796.983	306.254		

REALIZZAZIONE CDC SENISE - APPALTO INTEGRATO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI

Cod PDA	CIG	Data Pubbl.CIG	Accordo Quadro	Oggetto Contratto	Importo Complessivo	Importo Aggiudicato	Data Aggiudic.	Aggiudicatari	SubAppalti
5000220668	A0443526D6	28/12/2023	932678634A	LAVORI	3.796.983		10/11/2022		
Procedura Aggiudicazione				Modalità Realizzazione				Motivo assenza CIG	
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE				CONTRATTO D'APPALTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO					

REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI SENISE - PROGETTAZIONE PFTEE DEFINITIVA.

Cod PDA	CIG	Data Pubbl.CIG	Accordo Quadro	Oggetto Contratto	Importo Complessivo	Importo Aggiudicato	Data Aggiudic.	Aggiudicatari	SubAppalti
5000134475	9671427A08	30/03/2023	9326122F53	SERVIZI	240.342		10/11/2022	1	2
Procedura Aggiudicazione				Modalità Realizzazione				Motivo assenza CIG	
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE				CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO					

Negoziazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità										
GARE										
N	Totale €	Aggiudicati €	Data Ultima Aggiudicazione	Aggiudicatari	SubAppalti	Lavori	Servizi	Forniture	Altro	
4	4.103.237	65.912	05/06/2023	4	2	3.796.983	306.254			
REALIZZAZIONE CDC SENISE - APPALTO INTEGRATO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI										
Cod PDA	CIG	Data Pubbl.CIG	Accordo Quadro	Oggetto Contratto	Importo Complessivo	Importo Aggiudicato	Data Aggiudic.	Aggiudicatari	SubAppalti	
5000220668	A0443526D6	28/12/2023	932678634A	LAVORI	3.796.983		10/11/2022			
Procedura Aggiudicazione				Modalità Realizzazione					Motivo assenza CIG	
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE				CONTRATTO D'APPALTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO						
REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI SENISE - PROGETTAZIONE PFTEE DEFINITIVA.										
Cod PDA	CIG	Data Pubbl.CIG	Accordo Quadro	Oggetto Contratto	Importo Complessivo	Importo Aggiudicato	Data Aggiudic.	Aggiudicatari	SubAppalti	
5000134475	9671427A08	30/03/2023	9326122F53	SERVIZI	240.342		10/11/2022	1	2	
Procedura Aggiudicazione				Modalità Realizzazione					Motivo assenza CIG	
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE				CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO						
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI INSERITI NEL PNRR - STRUTTURA DI SENISE										
Cod PDA	CIG	Data Pubbl.CIG	Accordo Quadro	Oggetto Contratto	Importo Complessivo	Importo Aggiudicato	Data Aggiudic.	Aggiudicatari	SubAppalti	
5000134476	97356608C8	05/08/2022		SERVIZI	3.606	3.606	10/08/2022	2	0	
Procedura Aggiudicazione				Modalità Realizzazione					Motivo assenza CIG	
AFFIDAMENTO DIRETTO				CONTRATTO D'APPALTO						
Imprese partecipanti										
A/S	Cod.Fiscale	Denominazione	Forma Giur.	Ruolo	Cod ATECO	Ateco				
A	*****	VIOLA GIUSEPPE		IMPRESA SINGOLA	74.20	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE Attività fotografiche				
A	00875650764	VIOLA GIUSEPPE	Non Disponibile	IMPRESA SINGOLA	74.20	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE Attività fotografiche				

Votiamo Sì
per cambiare l'Italia



il voto
è la
nostra
rivolta

Con il referendum non lasci che gli altri decidano per te



LAVORO | SICUREZZA | DIGNITÀ | CITTADINANZA | DEMOCRAZIA

REFERENDUM

8-9 GIUGNO

il voto
è la
nostra
rivolta

*Prendi il tuo impegno, non lasciare
che gli altri decidano per te*

LAVORO | SICUREZZA | DIGNITÀ | CITTADINANZA | DEMOCRAZIA
